

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

пгт. Кошурниково

«1» марта 2023 г.

Муниципальное образование поселок Кошурниково Курагинского района Красноярского края, от имени которого выступает администрация поселка Кошурниково, в лице главы поселка Пасеки Виктора Богдановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концедентом**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»**, в лице директора Михальченко Екатерины Иннокентьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионером**, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением от 14 марта 2019 года № 15 (далее Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения проведена 1 марта 2023 года.

2. Проверяемый период: по состоянию на 31 декабря 2022 года.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества — объекта Концессионного соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения, проверки наличия и сохранности муниципального имущества — объекта Концессионного соглашения.

Выполнение мероприятий предусмотренного Концессионным соглашением:

Согласно перечня мероприятий в отношении объектов Концессионного соглашения в 2019 году были проведены следующие работы:

- Реконструкция водопровода по ул. Береговая, пгт. Кошурниково (290м), стоимость мероприятий составляет 278,785 тыс. руб.

- Реконструкция водопровода по ул. Фестивальная, пгт. Кошурниково (152м) стоимость мероприятий составляет 94,495 тыс. руб.

- Реконструкция водопровода по ул. Влада Листьева, пгт. Кошурниково (320м) стоимость мероприятий составляет 385,152 тыс. руб.

- Реконструкция водопровода по ул. Строительная, пгт. Кошурниково (120м) стоимость мероприятий составляет 178,412 тыс. руб.

Общая стоимость мероприятий составляет 936, 844 тыс. руб.

2. В части исполнения Концессионером обязательств по выполнению Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности (далее показатели):

Концессионеру необходимо обеспечить повышение показателей, провести мероприятия по снижению величин удельного расхода электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды и транспортировки сточных вод. Снижение технологических потерь при передаче воды по водопроводным сетям, Концессионным соглашением, не предусмотрено.

3. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера — в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий - в приложении 3 к акту.

4. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концедента

/В.Б. Пасека/

М.П.



От имени Концессионера

/Е.И. Михальченко/

М.П.



**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов водоснабжения и водоотведения за 2022 год.**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измер.	План 2022	Факт 2022
1.	Показатели надежности			
1.1	количество прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях, Ед/км	ед./км	0	0
1.2	количество прекращений подачи водоотведения в результате технологических нарушений на сетях водоотведения, ед/км	ед./км	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1	величина технологических потерь при передачи воды по водопроводным сетям	%	20,52	20,52
2.2	удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды	кВт.ч/м.куб	1,15	1,15
2.3	удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/м.куб	0,77	0,77

В результате исполнения мероприятий Концессионером в 2022 году были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измер.	План 2022	Факт 2022
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,	%	0	0

	сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			
2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км	0	0

Приложение 2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением
№ 15 от 14.03.2019г.

**Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера теплоснабжения за 2022 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2022	Факт 2022
1	Базовый уровень операционных расходов водоснабжение	тыс.руб. Без НДС	5381,25	5381
	Базовый уровень операционных расходов водоотведение	тыс.руб. Без НДС	5840,15	5500
2	Индекс эффективности операционных расходов водоснабжения	%	1	1
	Индекс эффективности операционных расходов водоотведения	%	1	1
3	Нормативный уровень прибыли водоснабжения	тыс.руб. Без НДС	0	0
	Нормативный уровень прибыли водоотведения	тыс.руб. Без НДС	0	0
4	Нормативный уровень прибыли водоснабжения	%	0	353
	Нормативный уровень прибыли водоотведения	%	0	361
5	Сумма валовой выручки водоснабжение	тыс.руб. Без НДС	7580,76	5734
	Сумма валовой выручки водоотведение	тыс.руб. Без НДС	8543,71	6022
6	Объем полезного отпуска водоснабжения	тыс. м3	53.16	51,9
	Объем полезного отпуска водоотведение	тыс. м3	28,0	26,0

Приложение 3 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением
№ 15 от 14.03.2019г.

**Мониторинг финансирования мероприятий водоснабжения, водоотведения за
2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия/источника	План 2022	Факт 2022
1	Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам:	920,26	936, 844
	Реконструкция водопровода по ул. Береговая, пгт. Кошурниково (290м)		278,785
	Реконструкция водопровода по ул. Фестивальная, пгт. Кошурниково (152м)		94,495
	Реконструкция водопровода по ул. Влада Листьева, пгт. Кошурниково (320м)		385,152
	Реконструкция водопровода по ул. Строительная, пгт. Кошурниково (120м)		178,412
2	Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Концессионного соглашения на 2020 год, тыс.руб. без НДС	920,26	936, 844
3	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта Концессионного соглашения, тыс.руб. без НДС	X	X
4	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта Концессионного соглашения, тыс.руб. без НДС	X	X
	ИТОГО:	920,26	936, 844

ОТЧЕТ КОНЦЕССИОНЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Место подписания:

Дата подписания:

В соответствии с Концессионным соглашением № 15 от 14.03.2019г. в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Кошурниково, [общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», в лице Директора *Михайличенко Екатерина Минюковичевна, действующего на основании Устава*], именуемым в дальнейшем «Концессионер», за 2022 год исполнены следующие мероприятия:

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	Реконструкция водопровода по ул. Береговая, пгт. Кошурниково (290м)	2022	2022	2022	2022	план	факт	
2	Реконструкция водопровода по ул. Фестивальная, пгт. Кошурниково (152м)	2022	2022	2022	2022	920,26	94,495	
3	Реконструкция водопровода по ул. Влада Дистьева, пгт. Кошурниково (320м)	2022	2022	2022	2022		385,152	
4	Реконструкция водопровода по ул. Строительная, пгт. Кошурниково (120м)	2022	2022	2022	2022	178,412		
ИТОГО:						920,26	936,844	
Размер средств, возмещенных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом								



В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в 2021 году были достигнуты следующие показатели надежности и энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
Показатели надежности			
1	Количество прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях, Ед./км.	0	0
2	Количество прекращений водоотведения в результате технологических нарушений на сетях водоотведения, Ед./км.	0	0
3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
5	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, собираемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
6	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, %	0	0
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения			
7	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежавших организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0	0

Показатели энергетической эффективности

8	Величина технологических потерь при передаче воды по водопроводным сетям, %	20,52	20,52
9	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, кВт.ч/м.куб	1,15	1,15
10	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт.ч/м.куб	0,77	0,77

Концедент:		
Глава поселка Кошурниково Курагинского района Красноярского края		
(должность)		В.Б. Пасека
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Концессионер:		
Директор ООО "Водоканал"		
(должность)		Е.И. Михальченко
	(подпись)	(расшифровка подписи)



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		78 746,00	73 746,00	78 746,00
	реконструкция водопровода по ул. Фестивальная (152м)		78 746,00	78 746,00	78 746,00
Итого					78 746,00
Сумма НДС					15 749,20
Всего					94 495,20

Сдал Директор "Водоканал"


 ООО «ВОДОКАНАЛ»
 ИНН 2423014512
 ОГРН 10224000184
 КПП 5001000018
 1000 - ВОДОКАНАЛ
 * ВОДОКАНАЛ *
 * П.Г.Т. КРАСНОАРМЕНСК *

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково


 АДМИНИСТРАЦИЯ
 П. КОШУРНИКОВО
 ИНН 2423005610
 ОГРН 50182978
 П. КОШУРНИКОВО

О.А. Баландина

Инвестор:
Заказчик: Администрация п. Кошурниково
Подрядчик: ООО "Водоканал"
Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Код
0322001

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1		3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		78 746,00	78 746,00	78 746,00
	реконструкция водопровода по ул. Фестивальная (152м)		78 746,00	78 746,00	78 746,00
Итого					78 746,00
Сумма НДС					15 749,20
Итого					94 495,20

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКД	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		78 746,00	78 746,00	78 746,00
	реконструкция водопровода по ул. Фестивальная (152м)		78 746,00	78 746,00	78 746,00
Итого					78 746,00
Сумма НДС					15 749,20
					94 495,20

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		232 321,00	232 321,00	232 321,00
	реконструкция водопровода по ул. Береговая (290м)		232 321,00	232 321,00	232 321,00
Итого					232 321,00
Сумма НДС					46 464,20
Всего					278 785,20

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		232 321,00	232 321,00	232 321,00
	реконструкция водопровода по ул. Береговая (290м)		232 321,00	232 321,00	232 321,00
Итого					232 321,00
Сумма НДС					46 464,20
Всего					278 785,20

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		232 321,00	232 321,00	232 321,00
	реконструкция водопровода по ул. Береговая (290м)		232 321,00	232 321,00	232 321,00
Итого					232 321,00
Сумма НДС					46 464,20
Всего					278 785,20

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		320 960,00	320 960,00	320 960,00
	реконструкция водопровода по ул. Влада Листьева (320м)		320 960,00	320 960,00	320 960,00
Итого					320 960,00
Сумма НДС					64 192,00
Всего					385 152,00

Сдал Директор "Водоканал"



Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково



О.А. Баландина

Инвестор:
Заказчик: Администрация п. Кошурниково
Подрядчик: ООО "Водоканал"
Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП

Код
0322001
номер
дата
Вид операции

Договор подряда (контракт)

номер
дата
Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		320 960,00	320 960,00	320 960,00
	реконструкция водопровода по ул. Влада Листьева (320м)		320 960,00	320 960,00	320 960,00
	Итого				320 960,00
	Сумма НДС				64 192,00
	Всего				385 152,00

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		320 960,00	320 960,00	320 960,00
	реконструкция водопровода по ул. Влада Листьева (320м)		320 960,00	320 960,00	320 960,00
Итого					320 960,00
Сумма НДС					64 192,00
Всего					385 152,00

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

-О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	18.05.2022	с	по
			01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		148 677,00	148 677,00	148 677,00
	реконструкция водопровода по ул. Строительная (120м)		148 677,00	148 677,00	148 677,00
	Итого:				148 677,00
	Сумма НДС:				29 735,40
	Всего:				178 412,40

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина



Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		148 677,00	148 677,00	148 677,00
	реконструкция водопровода по ул. Строительная (120м)		148 677,00	148 677,00	148 677,00
Итого					148 677,00
Сумма НДС					29 735,40
Всего					178 412,40

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина

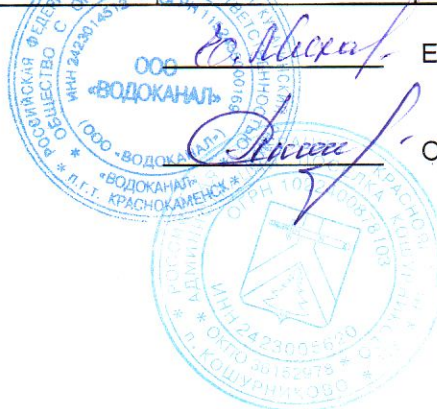

Инвестор:
 Заказчик: Администрация п. Кошурниково
 Подрядчик: ООО "Водоканал"
 Стройка: водопроводные сети п. Кошурниково

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	31.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		148 677,00	148 677,00	148 677,00
	реконструкция водопровода по ул. Строительная (120м)		148 677,00	148 677,00	148 677,00
Итого					148 677,00
Сумма НДС					29 735,40
Всего					178 412,40

Сдал Директор "Водоканал"

Е.И. Михальченко

Принял Глава поселка Кошурниково

О.А. Баландина

